
# V601 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

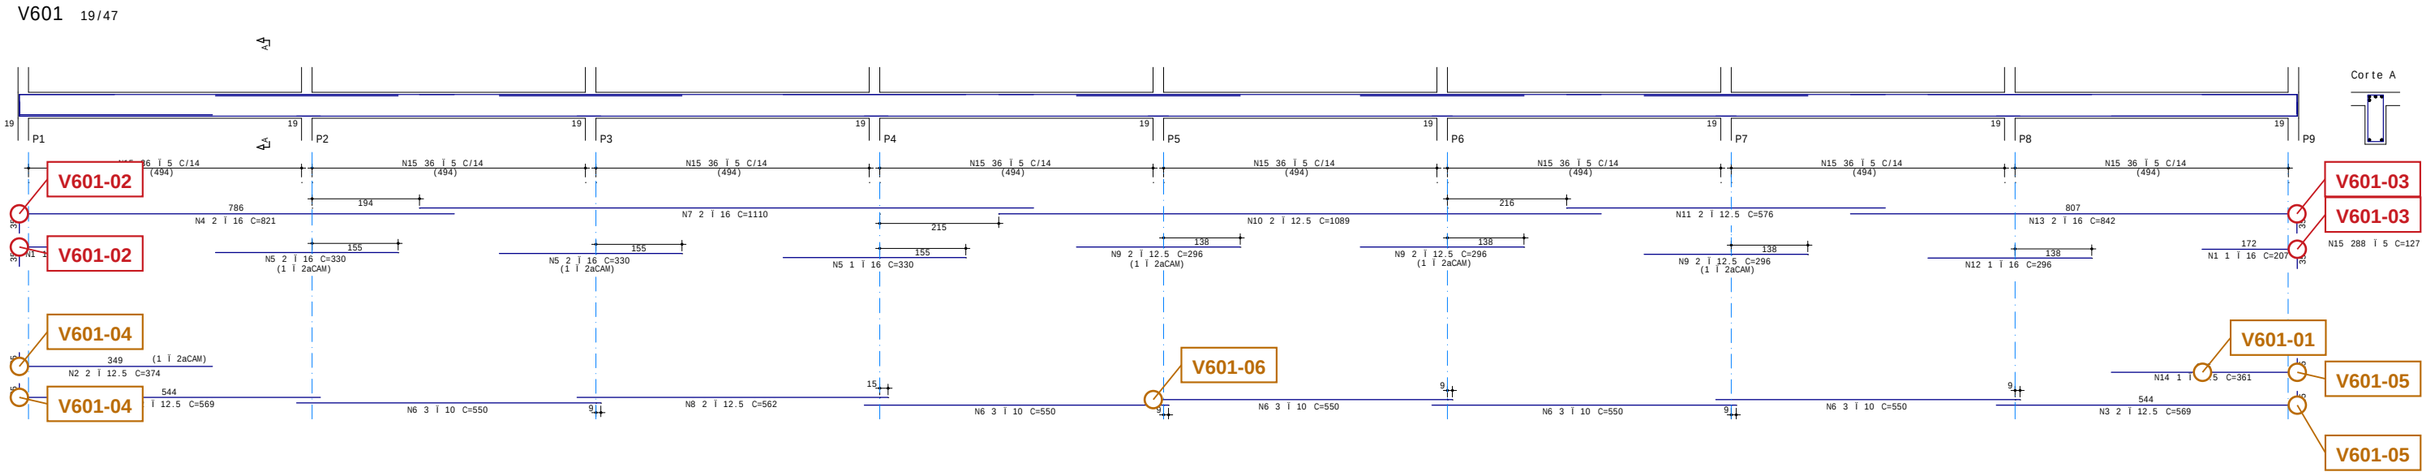


## V601-01 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 8, positiva (N14, N3): Msk=46.395; capacidade equivalente Mk=46.371 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

## V601-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P1. N4: perna 35.0 < 44.0 cm; N1: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V601-03 | Terminações da armadura negativa

Apoio P9. N13: perna 35.0 < 44.0 cm; N1: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V601-04 | Ancoragem positiva no apoio

P1: As requerida/presente = 3.94/4.91 cm²; lb necessário/geometria = 27.6/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V601-05 | Ancoragem positiva no apoio

P9: As requerida/presente = 4.94/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 46.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V601-06 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N6, N6, camada 1, x=20.23 a 20.42 m. Largura necessária 16.0 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 14 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V602 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

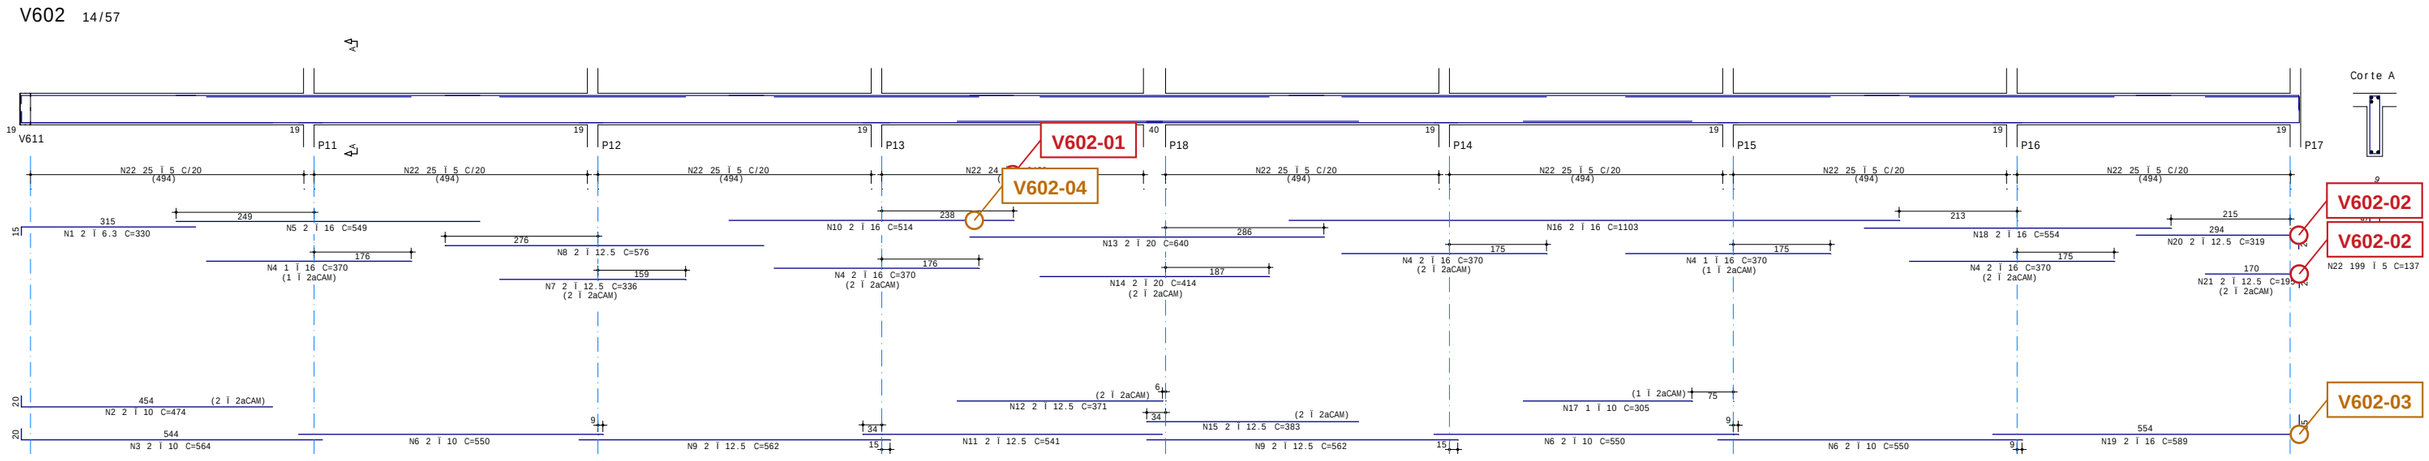


## V602-01 | Cortante / estribos

Vão 4, x=15.38 a 20.11 m: Ø5 c/20. Asw/s fornecida 1.963; exigida 2.003 cm²/m. Vk=82.24 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

## V602-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P17. N20: perna 25.0 < 54.0 cm; N21: perna 25.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V602-03 | Ancoragem positiva no apoio

P17: As requerida/presente = 4.47/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 49.0/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V602-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N10, N13, N4, camada 1, x=16.97 a 17.14 m. Largura necessária 13.2 / livre 8.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 27 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V603 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

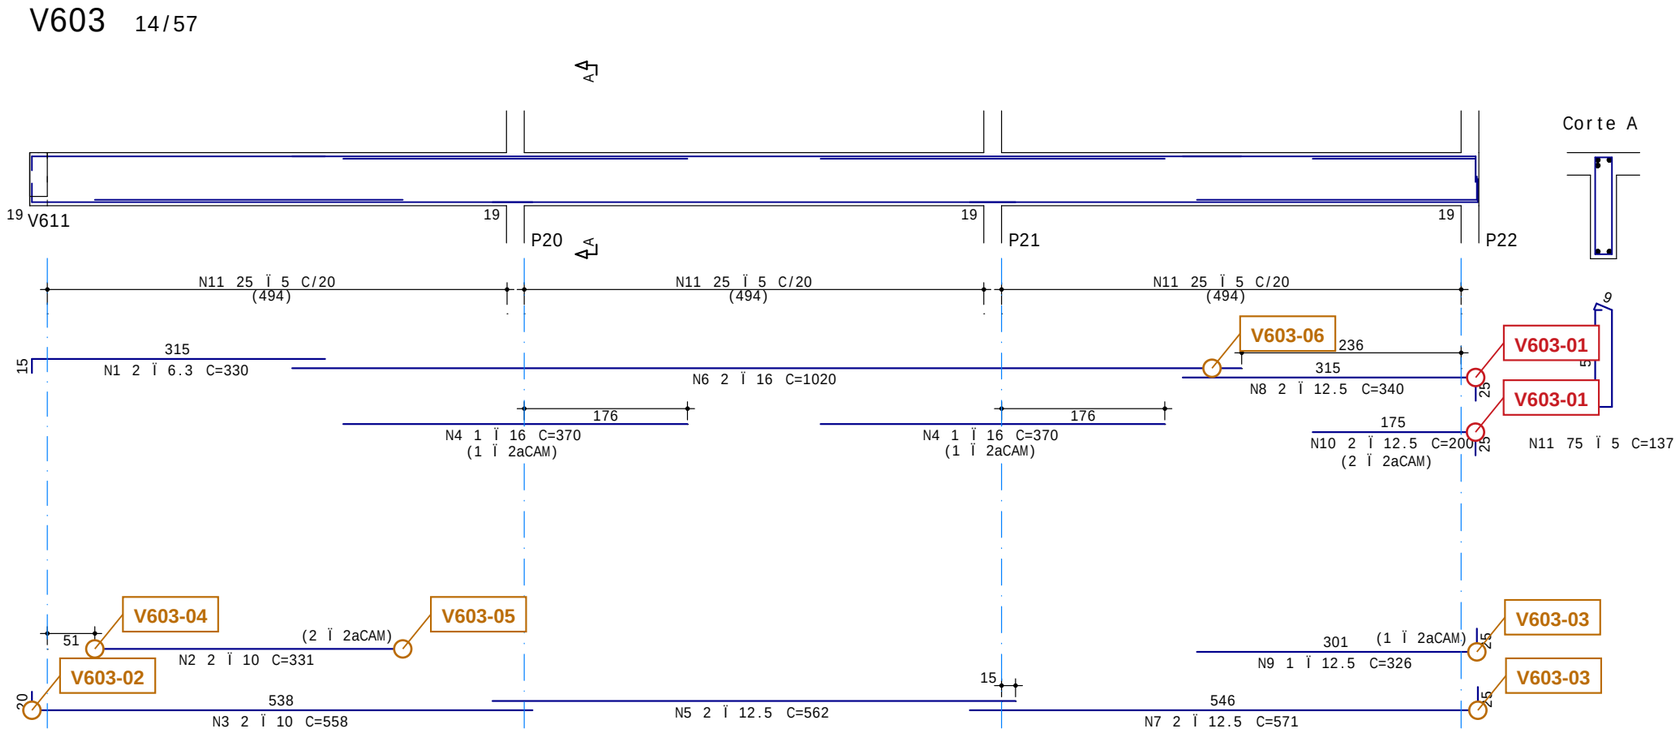


## V603-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P22. N8: perna 25.0 < 54.0 cm; N10: perna 25.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V603-03 | Ancoragem positiva no apoio

P22: As requerida/presente = 4.43/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 41.4/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V603-05 | Interrupção de barra positiva

N2, corte direito: condição A, disponível 7.1 / exigido 62.0 cm; condição B, 177.9/79.5 cm. Conferir decalagem e composição resistente; ensaio conservador, sem crédito integral das mesas.

## V603-02 | Ancoragem positiva no apoio

V611: As requerida/presente = 1.43/1.57 cm²; lb necessário/geometria = 25.0/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V603-04 | Interrupção de barra positiva

N2, corte esquerdo: condição A, disponível 25.1 / exigido 62.0 cm; condição B, 153.0/79.5 cm. Conferir decalagem e composição resistente; ensaio conservador, sem crédito integral das mesas.

## V603-06 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N6, N8, camada 1, x=12.20 a 12.83 m. Largura necessária 11.7 / livre 8.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 6 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V604 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

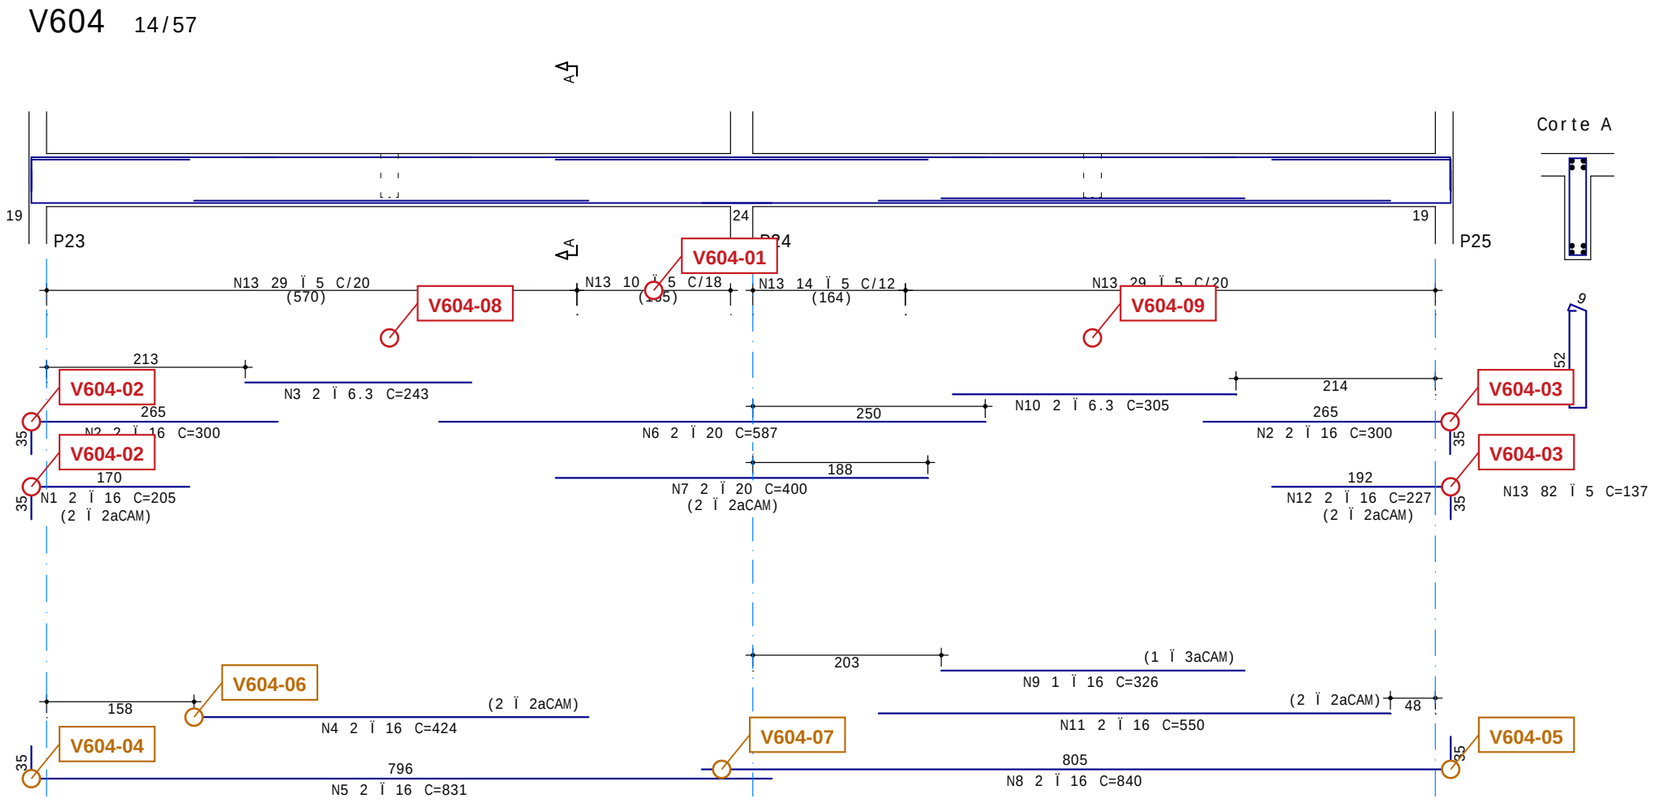


**V604-01 | Cortante / estribos**

Vão 1, x=5.70 a 7.35 m: Ø5 c/18. Asw/s fornecida 2.182; exigida 2.245 cm²/m. Vk=85.69 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

**V604-02 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P23. N2: perna 35.0 < 54.0 cm; N1: perna 35.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V604-03 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P25. N2: perna 35.0 < 54.0 cm; N12: perna 35.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V604-04 | Ancoragem positiva no apoio**

P23: As requerida/presente = 1.94/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 21.2/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

**V604-05 | Ancoragem positiva no apoio**

P25: As requerida/presente = 2.72/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 29.8/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

**V604-06 | Interrupção de barra positiva**

N4, corte esquerdo: condição A, disponível 10.5 / exigido 67.4 cm; condição B, 210.3/95.5 cm. Conferir decalagem e composição resistente; ensaio conservador, sem crédito integral das mesas.

**V604-07 | Executabilidade / sobreposição**

Sobreposição interpretada: N8, N5, camada 1, x=7.04 a 7.47 m. Largura necessária 12.4 / livre 8.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 6 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

**V604-08 | Suspensão / apoio indireto**

Nó V624 -> V604. Asw/s existente 1.963 / total exigida 2.061 cm²/m. Resultado desfavorável para o ensaio de suspensão adotado. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

**V604-09 | Suspensão / apoio indireto**

Nó V628 -> V604. Asw/s existente 1.963 / total exigida 2.130 cm²/m. Resultado desfavorável para o ensaio de suspensão adotado. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V605 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

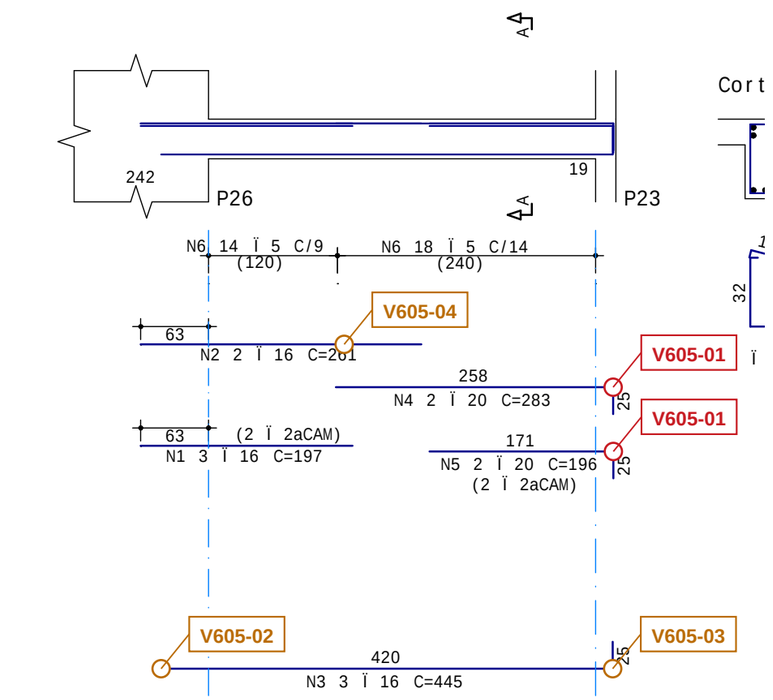


### V605-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P23. N4: perna 25.0 < 34.0 cm; N5: perna 25.0 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V605-03 | Ancoragem positiva no apoio

P23: As requerida/presente = 6.59/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 48.1/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V605-02 | Ancoragem positiva no apoio

P26: As requerida/presente = 5.36/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 39.2/239.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V605-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N2, N4, N1, camada 1, x=1.18 a 1.34 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 2 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V606 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

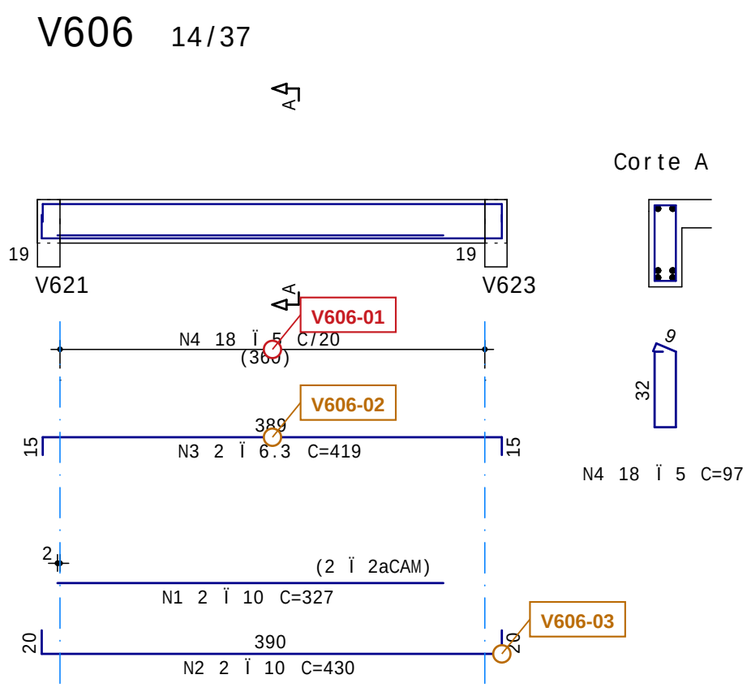


**V606-01 | Cortante / estribos**

Vão 1, x=0.00 a 3.60 m: Ø5 c/20. Asw/s fornecida 1.963; exigida 1.637 cm²/m. Vk=40.74 kN. Espaçamento 20 > máximo calculado 19.20 cm. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

**V606-02 | Flexão: conferir demanda e composição**

Vão 1, negativa (N3): Msk=9.159; capacidade equivalente Mk=6.445 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

**V606-03 | Ancoragem positiva no apoio**

V623: As requerida/presente = 1.34/1.57 cm²; lb necessário/geometria = 23.4/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V607 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

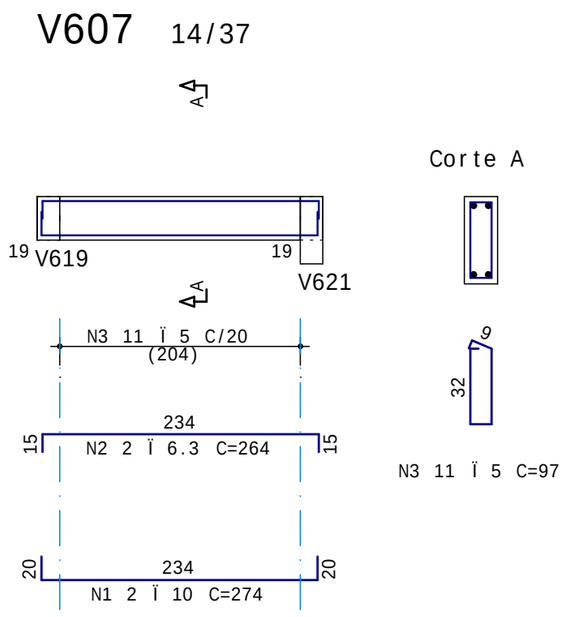


Sem ocorrência específica destacada nesta viga. Isso não representa aprovação global: os limites da revisão e as verificações condicionais permanecem no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V608 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

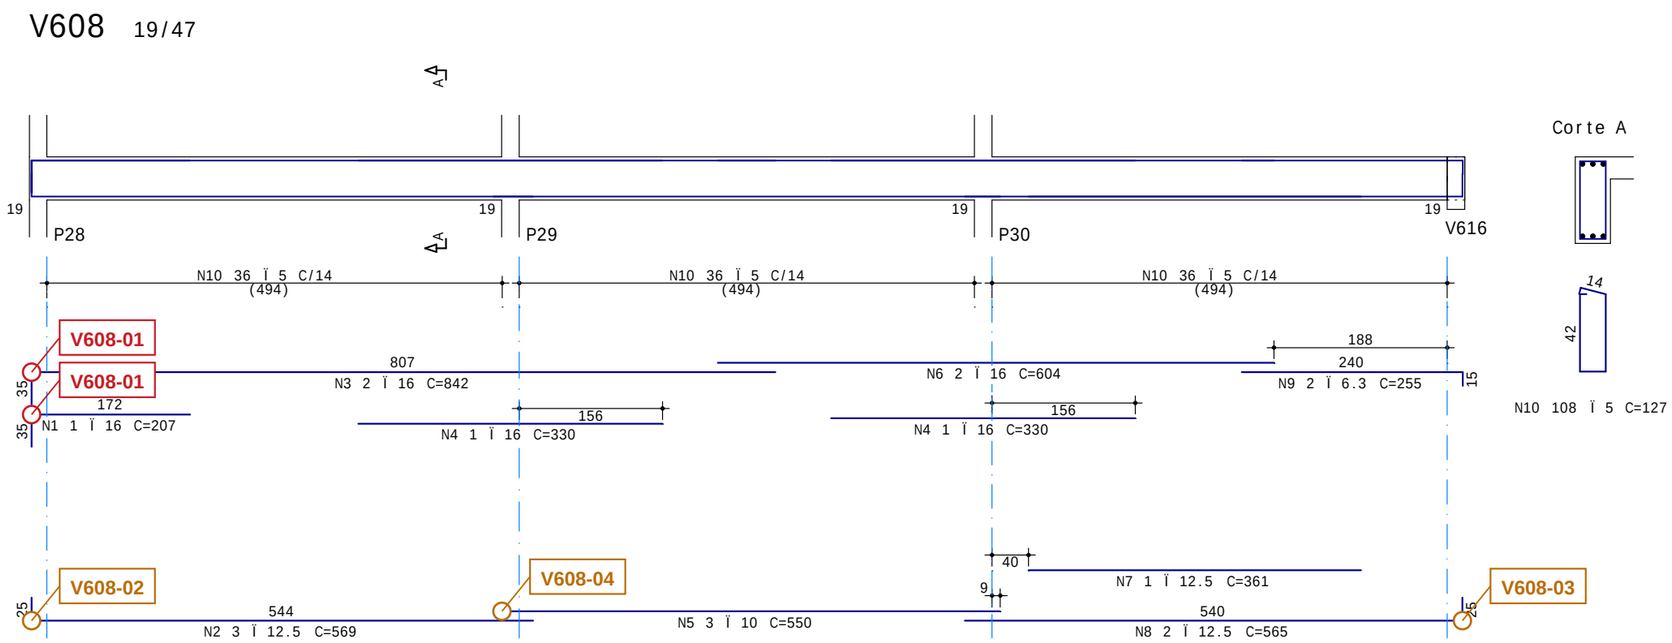


## V608-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P28. N3: perna 35.0 < 44.0 cm; N1: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V608-03 | Ancoragem positiva no apoio

V616: As requerida/presente = 1.60/2.45 cm²; lb necessário/geometria = 22.4/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

## V608-02 | Ancoragem positiva no apoio

P28: As requerida/presente = 3.46/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 32.4/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V608-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N5, N2, camada 1, x=4.85 a 5.03 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 4 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V609 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

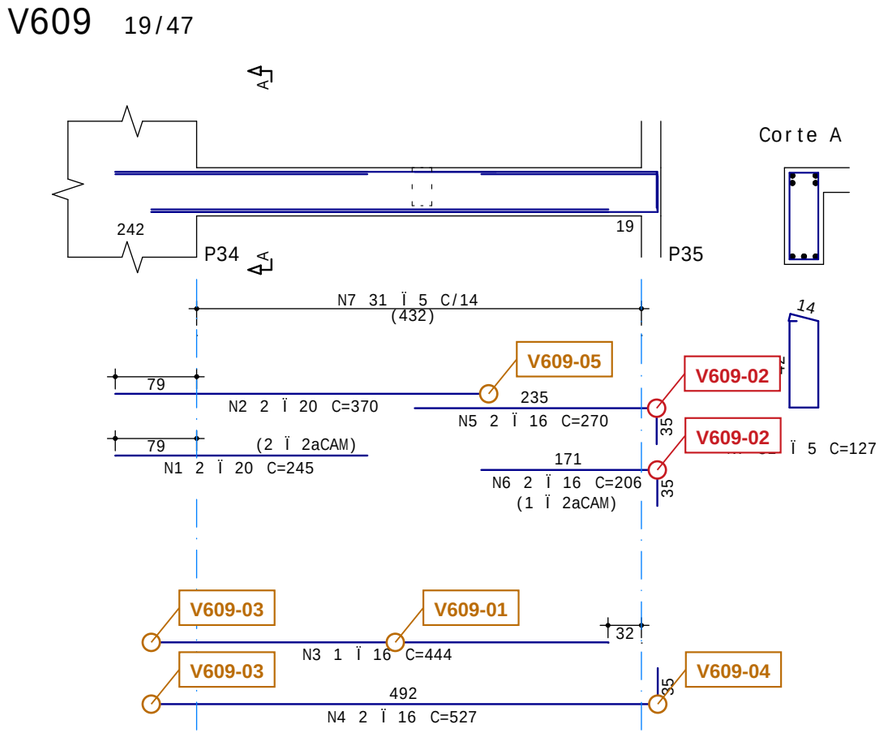


### V609-01 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, positiva (N3, N4): Msk=74.011; capacidade equivalente Mk=73.353 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

### V609-03 | Ancoragem positiva no apoio

P34: As requerida/presente = 6.37/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 46.5/239.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V609-05 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N2, N5, N6, camada 1, x=2.76 a 2.91 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 2 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

### V609-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P35. N5: perna 35.0 < 44.0 cm; N6: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V609-04 | Ancoragem positiva no apoio

P35: As requerida/presente = 5.31/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 58.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V610 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

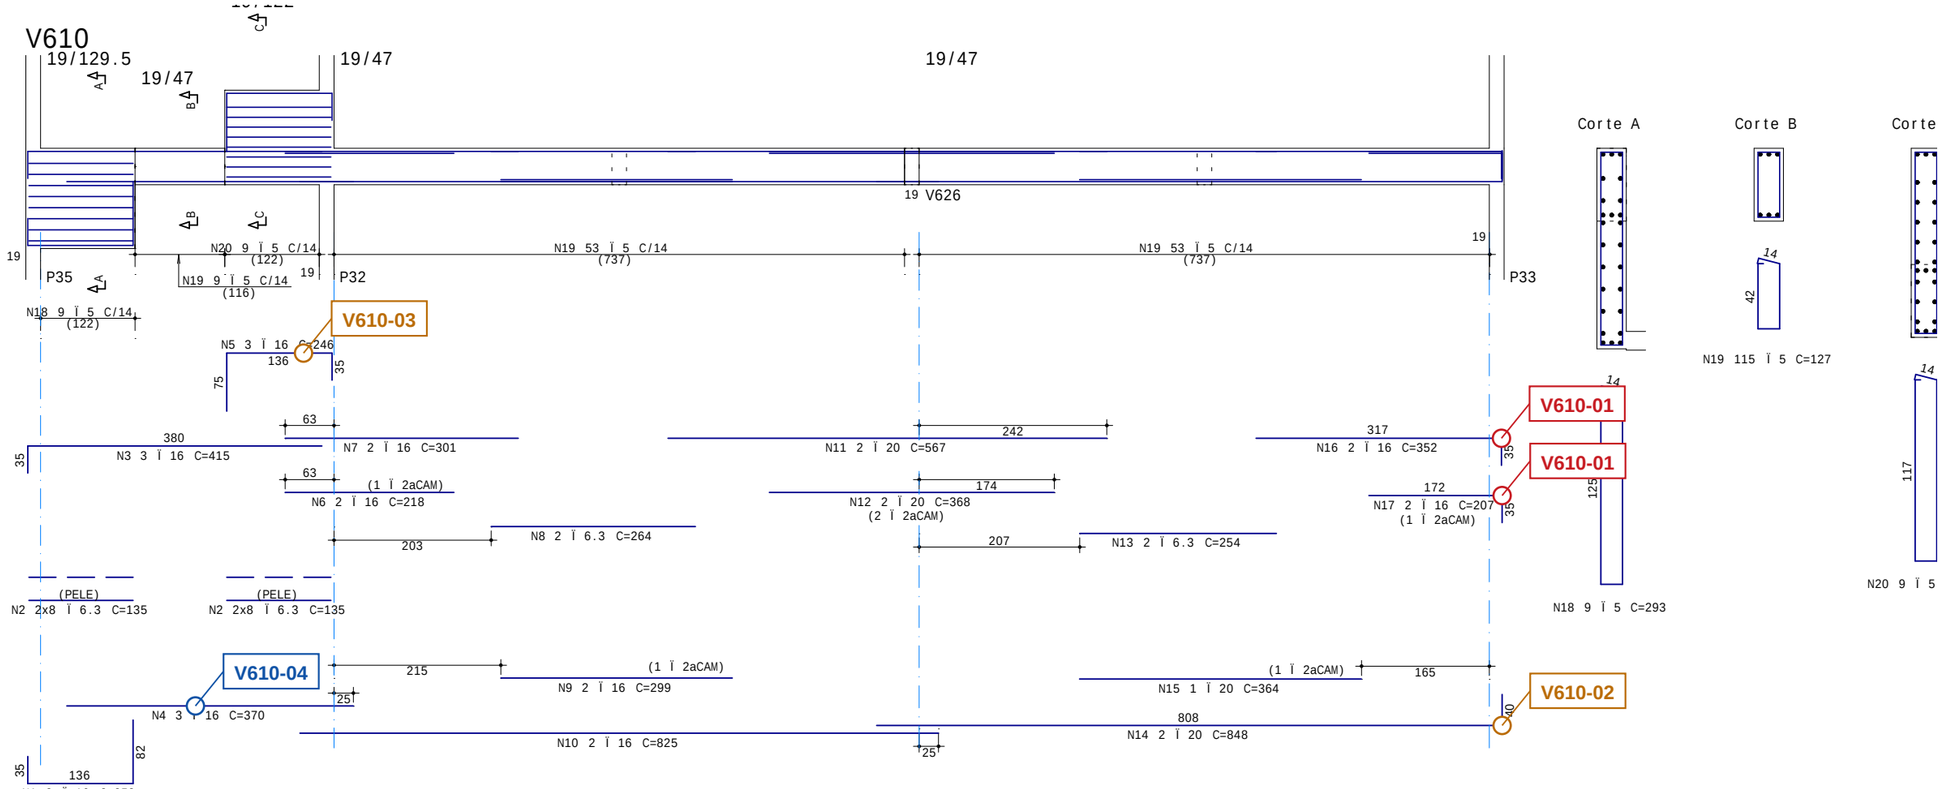


## V610-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P33. N16: perna 35.0 < 44.0 cm; N17: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V610-03 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N5, N7, N3, N6, camada 1, x=3.16 a 3.63 m. Largura necessária 30.4 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 9 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada. Barras em níveis distintos: não somar automaticamente na mesma camada.

## V610-02 | Ancoragem positiva no apoio

P33: As requerida/presente = 2.24/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 20.0/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V610-04 | Geometria e nó especial

Alturas 129,5 / 47 / 122 cm no primeiro vão; conferir transições, forma e níveis das armaduras. Seções distintas não podem ser substituídas por uma seção uniforme.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V611 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

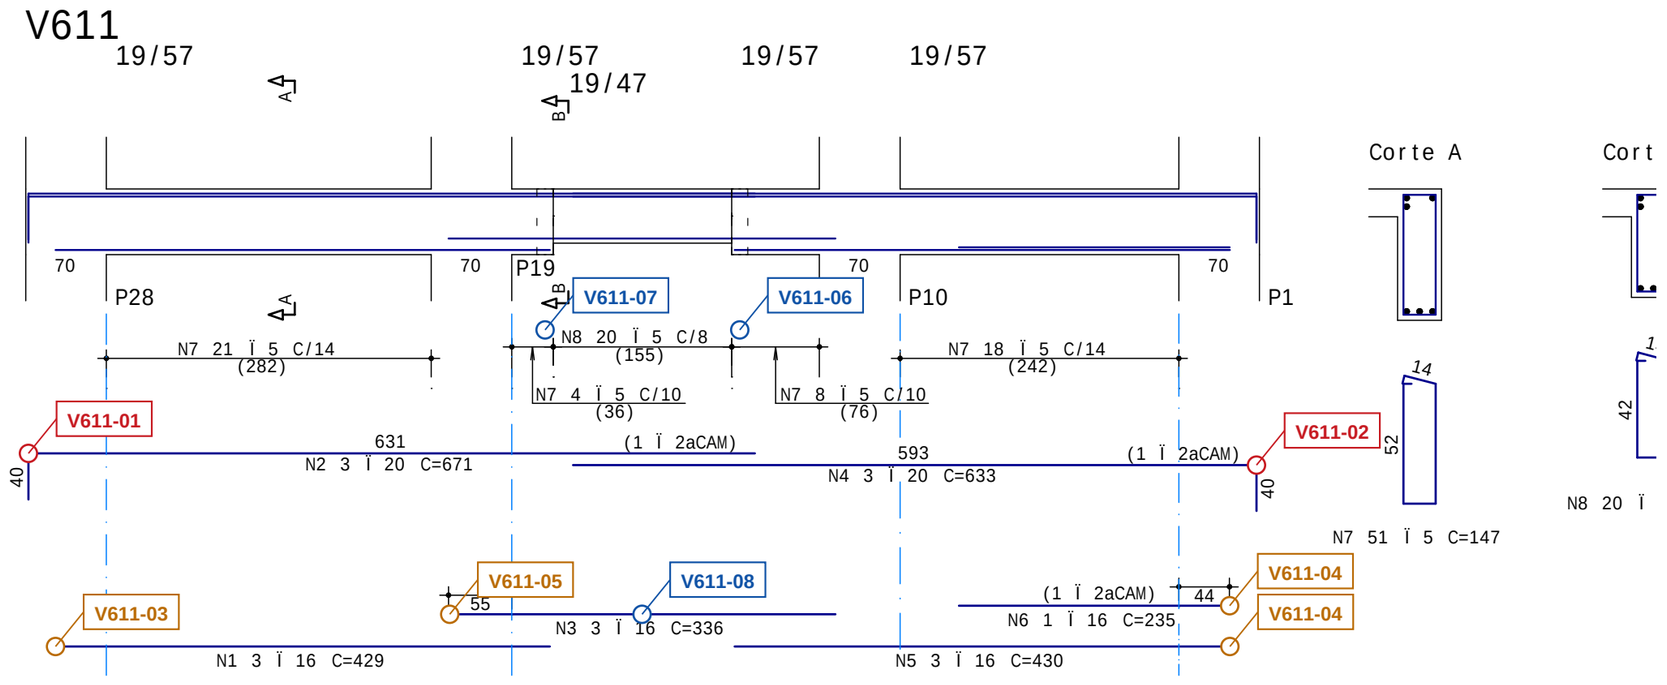


### V611-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P28. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V611-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P1. N4: perna 39.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V611-03 | Ancoragem positiva no apoio

P28: As requerida/presente = 7.05/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 51.5/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V611-04 | Ancoragem positiva no apoio

P1: As requerida/presente = 9.10/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 49.9/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V611-05 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N3, N1, camada 1, x=2.97 a 2.99 m. Largura necessária 19.6 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 5 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

### V611-06 | Suspensão / apoio indireto

Nó V602 -> V611. Faixa de distribuição cruza mudança de altura 57/47 cm; suspensão inconclusiva. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

### V611-07 | Suspensão / apoio indireto

Nó V603 -> V611. Faixa de distribuição cruza mudança de altura 57/47 cm; suspensão inconclusiva. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

### V611-08 | Geometria e nó especial

Trecho intermediário h=47 cm entre x=3,88 e 5,43 m. Conferir a transição com h=57 cm e os encontros com V602/V603.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V612 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

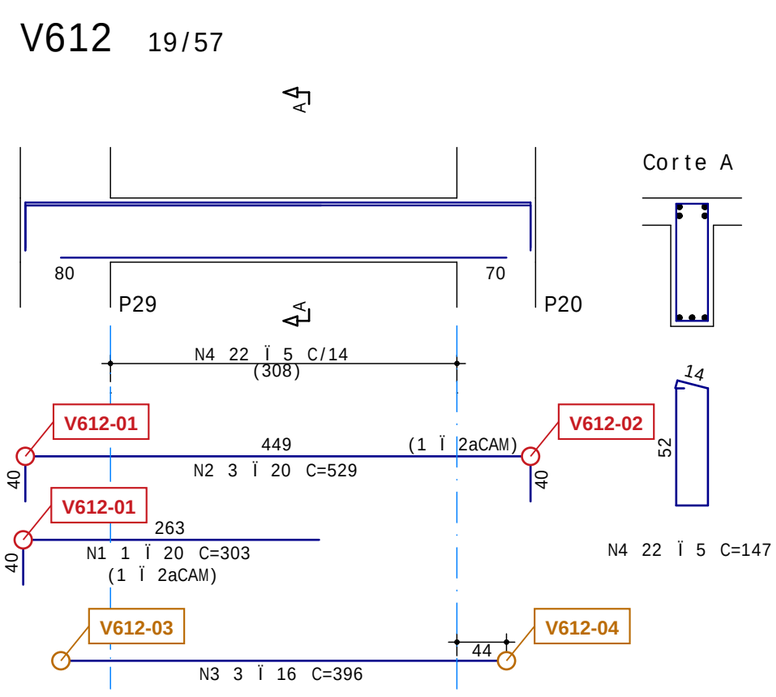


### V612-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P29. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N1: perna 39.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V612-03 | Ancoragem positiva no apoio

P29: As requerida/presente = 5.91/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 43.2/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V612-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P20. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V612-04 | Ancoragem positiva no apoio

P20: As requerida/presente = 9.00/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 65.7/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V613 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

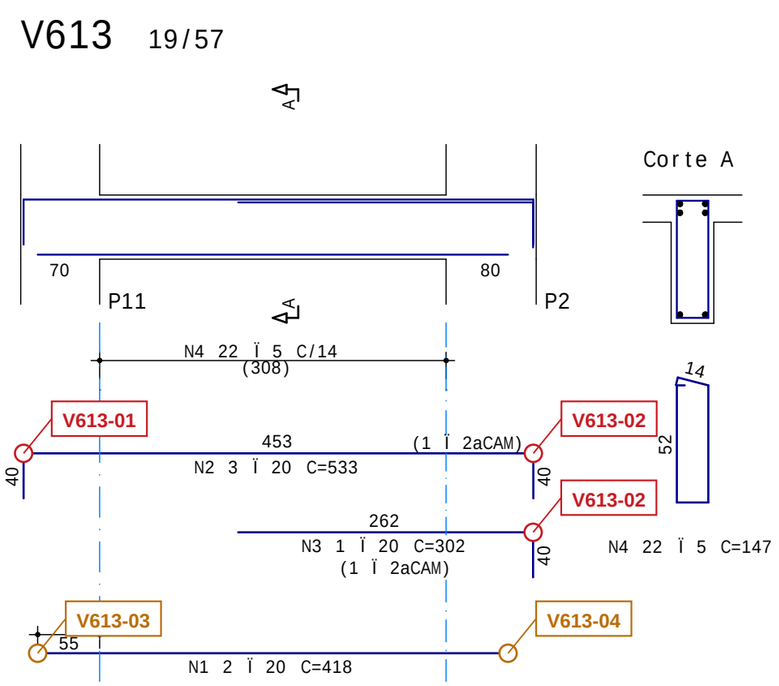


**V613-01 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P11. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V613-03 | Ancoragem positiva no apoio**

P11: As requerida/presente = 6.59/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 57.8/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

**V613-02 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P2. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N3: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V613-04 | Ancoragem positiva no apoio**

P2: As requerida/presente = 8.95/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 78.4/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V614 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

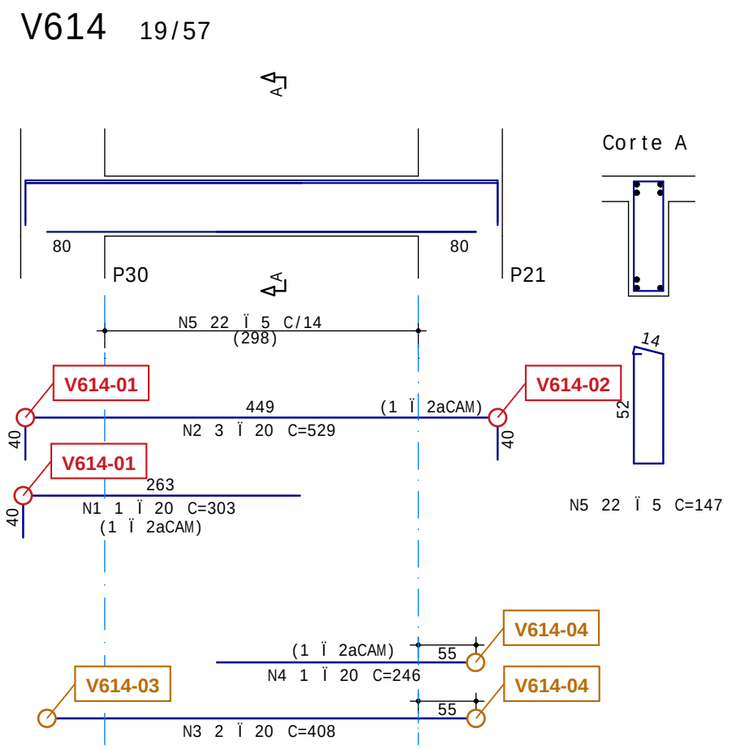


### V614-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P30. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N1: perna 39.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V614-03 | Ancoragem positiva no apoio

P30: As requerida/presente = 6.76/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 59.3/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V614-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P21. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V614-04 | Ancoragem positiva no apoio

P21: As requerida/presente = 10.29/9.42 cm²; lb necessário/geometria = 60.2/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V615 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

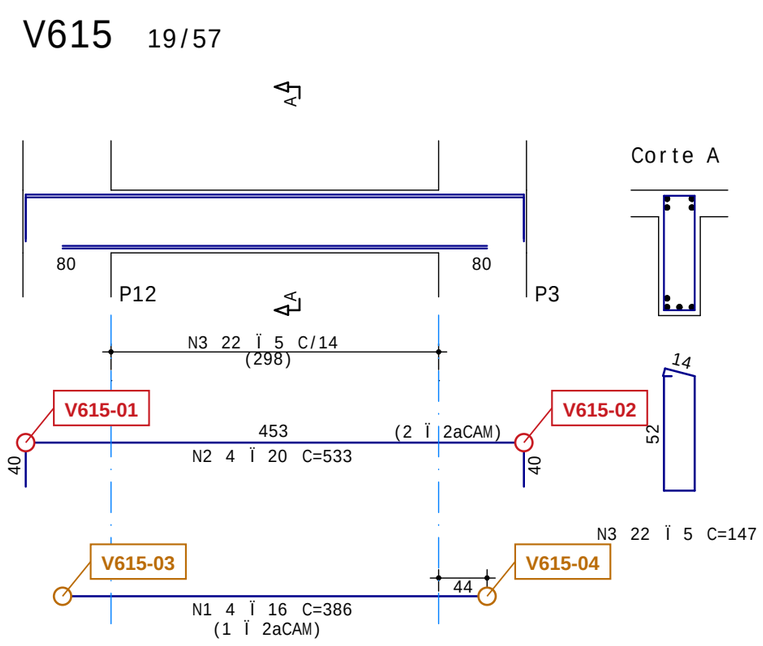


**V615-01 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P12. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V615-03 | Ancoragem positiva no apoio**

P12: As requerida/presente = 7.56/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 41.4/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

**V615-02 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P3. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V615-04 | Ancoragem positiva no apoio**

P3: As requerida/presente = 9.91/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 54.3/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V616 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

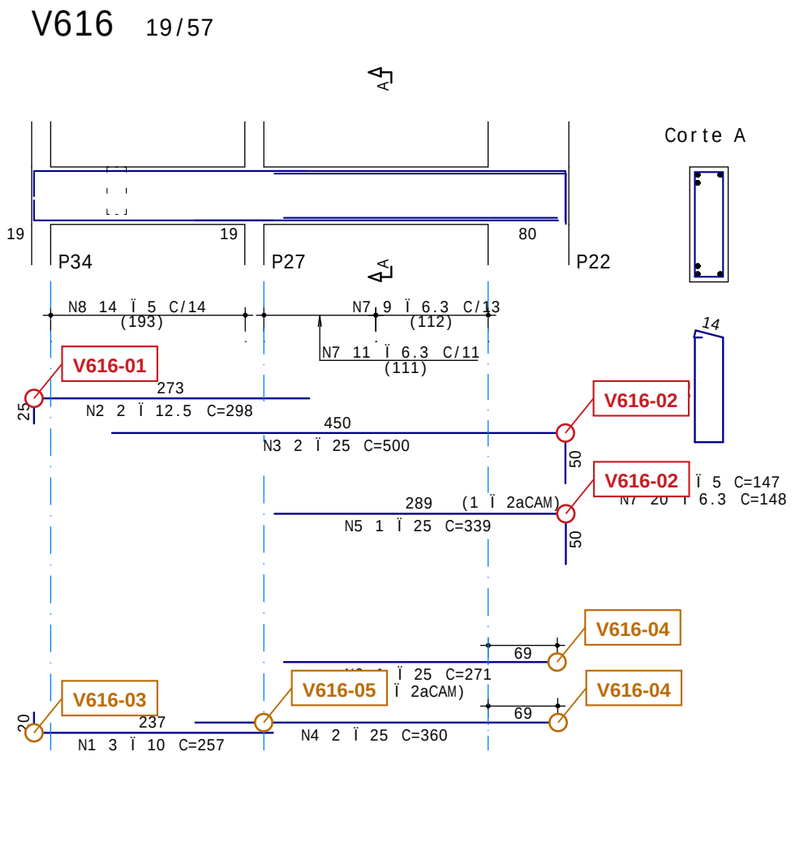


## V616-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P34. N2: perna 25.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V616-03 | Ancoragem positiva no apoio

P34: As requerida/presente = 2.07/2.36 cm²; lb necessário/geometria = 24.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V616-05 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N4, N1, camada 1, x=2.02 a 2.21 m. Largura necessária 17.0 / livre 12.7 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 5 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

## V616-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P22. N3: perna 50.0 < 53.9 cm; N5: perna 50.0 < 53.9 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V616-04 | Ancoragem positiva no apoio

P22: As requerida/presente = 17.97/14.73 cm²; lb necessário/geometria = 84.0/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V617 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

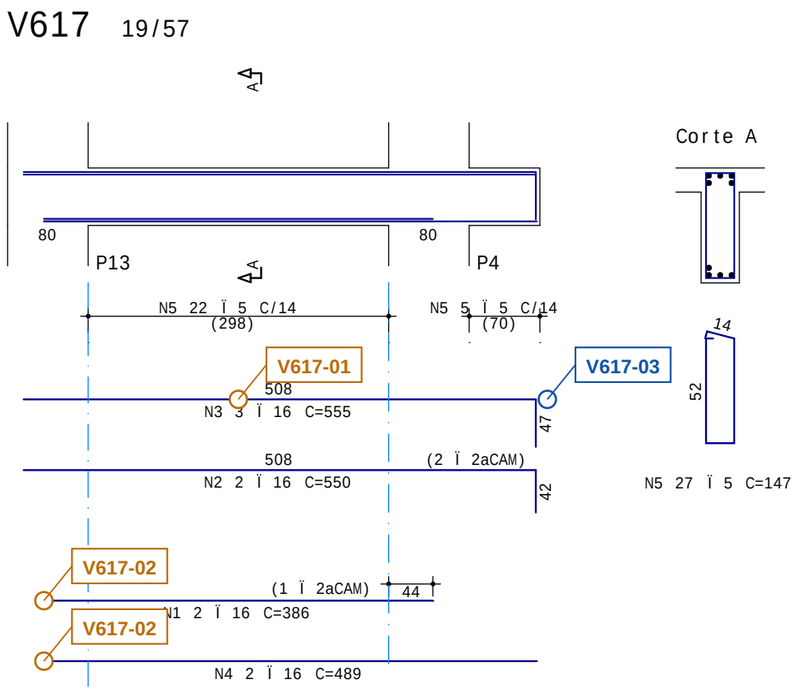


**V617-01 | Flexão: conferir demanda e composição**

Vão 1, negativa (N3, N2): Msk=149.306; capacidade equivalente Mk=146.812 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

**V617-03 | Continuação em balanço**

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

**V617-02 | Ancoragem positiva no apoio**

P13: As requerida/presente = 8.50/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 46.6/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V618 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

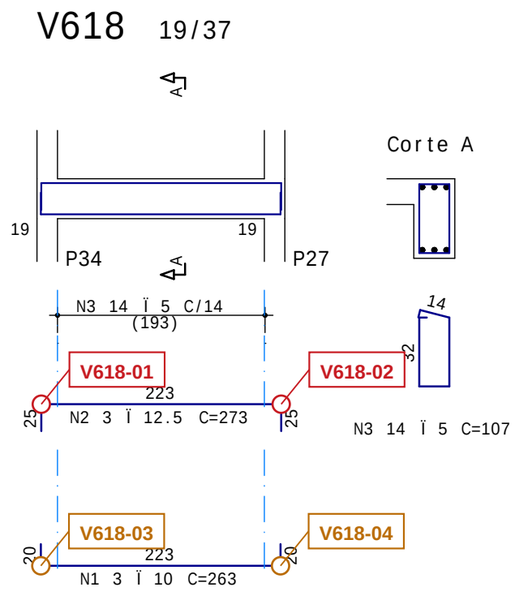


**V618-01 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P34. N2: perna 25.0 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V618-03 | Ancoragem positiva no apoio**

P34: As requerida/presente = 2.67/2.36 cm²; lb necessário/geometria = 31.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

**V618-02 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P27. N2: perna 25.0 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V618-04 | Ancoragem positiva no apoio**

P27: As requerida/presente = 3.72/2.36 cm²; lb necessário/geometria = 43.5/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V619 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

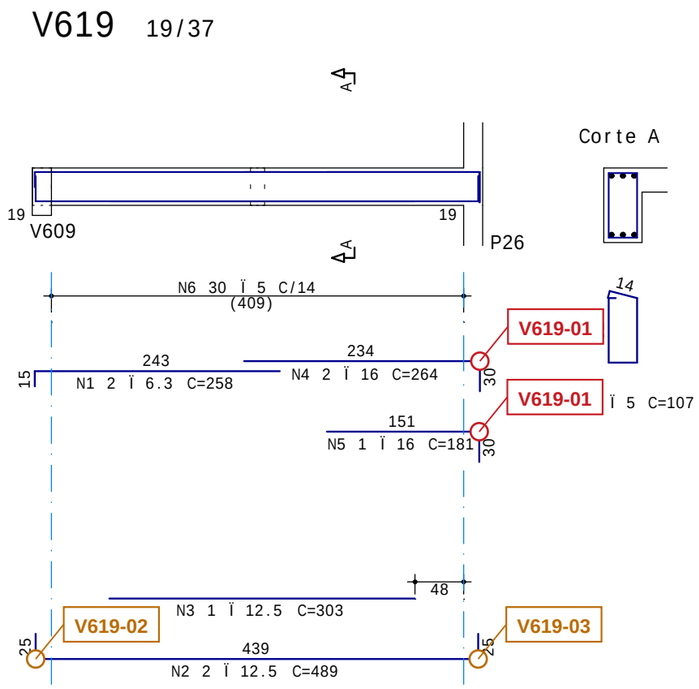


**V619-01 | Terminações da armadura negativa**

Apoio P26. N4: perna 29.9 < 34.0 cm; N5: perna 30.1 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

**V619-03 | Ancoragem positiva no apoio**

P26: As requerida/presente = 1.68/2.45 cm²; lb necessário/geometria = 23.5/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

**V619-02 | Ancoragem positiva no apoio**

V609: As requerida/presente = 1.26/2.45 cm²; lb necessário/geometria = 17.6/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V620 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

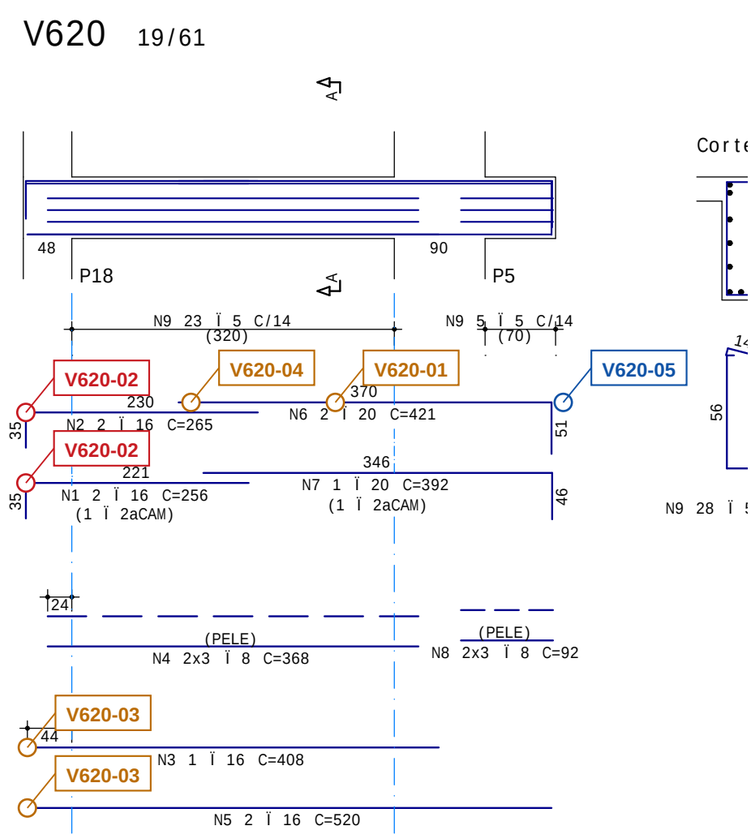


## V620-01 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, negativa (N6, N7): Msk=153.298; capacidade equivalente Mk=149.937 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

## V620-03 | Ancoragem positiva no apoio

P18: As requerida/presente = 6.61/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 48.3/45.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V620-05 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

## V620-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P18. N2: perna 35.0 < 58.0 cm; N1: perna 35.2 < 58.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V620-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N6, N2, N1, camada 1, x=1.06 a 1.31 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 3 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V621 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

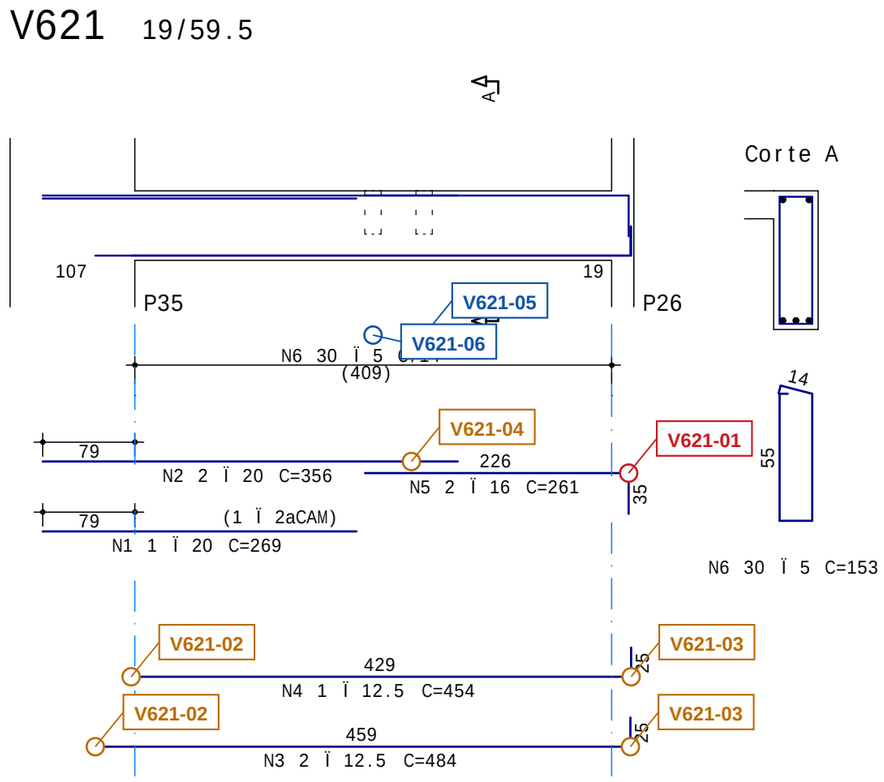


## V621-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P26. N5: perna 35.0 < 56.5 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V621-02 | Ancoragem positiva no apoio

P35: As requerida/presente = 2.56/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 23.9/104.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V621-03 | Ancoragem positiva no apoio

P26: As requerida/presente = 4.38/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 40.9/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V621-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N2, N5, camada 1, x=1.97 a 2.77 m. Largura necessária 13.2 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 1 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

## V621-05 | Suspensão / apoio indireto

Nó V606 -> V621. Faixas de suspensão de V606 e V607 se sobrepõem: conferir demanda conjunta e concomitância. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

## V621-06 | Suspensão / apoio indireto

Nó V607 -> V621. Faixas de suspensão de V606 e V607 se sobrepõem: conferir demanda conjunta e concomitância. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V622 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

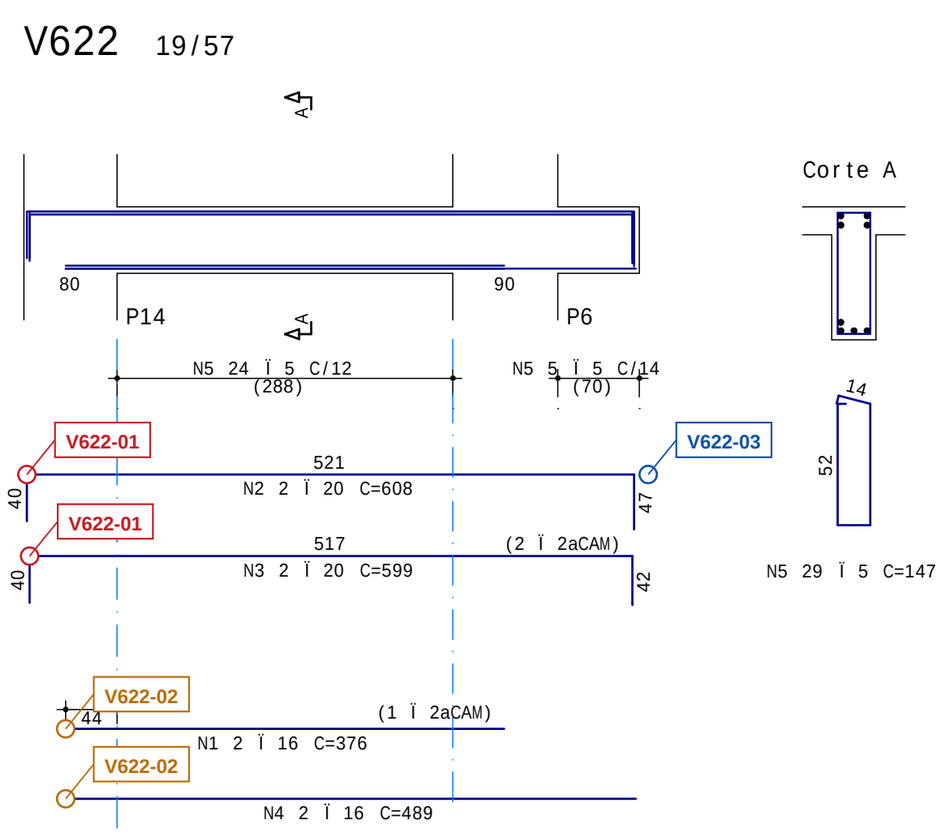


### V622-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P14. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N3: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V622-03 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

### V622-02 | Ancoragem positiva no apoio

P14: As requerida/presente = 8.60/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 47.1/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V623 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

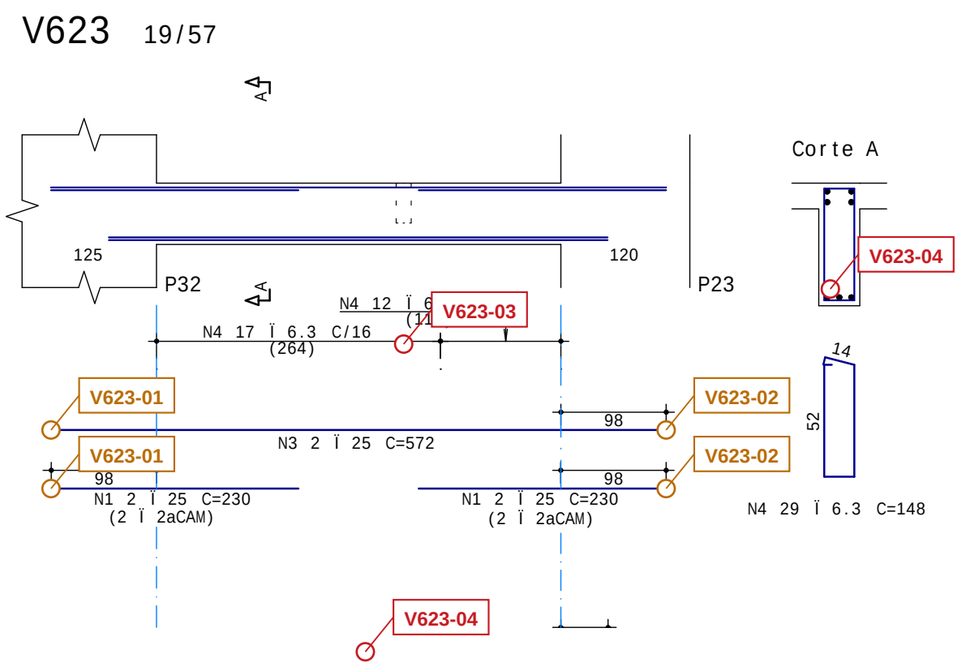


### V623-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P32. N3: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe); N1: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe). Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V623-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P23. N3: reta 97.94 / lb 98.34 cm (limítrofe); N1: reta 97.94 / lb 98.34 cm (limítrofe). Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V623-03 | Suspensão / apoio indireto

Nó V606 -> V623. Asw/s existente 3.897 / total exigida 4.285 cm²/m. Resultado desfavorável para o ensaio de suspensão adotado. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

### V623-04 | Armadura N2 sem posição longitudinal identificada

N2 = 4Ø16 C=464 consta na relação e na seção A, porém sua posição longitudinal/cotas não foi identificada na elevação. Positiva inconclusiva: confirmar posição, camadas e ancoragens. A marcação indica lacuna documental, não ausência física comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V624 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

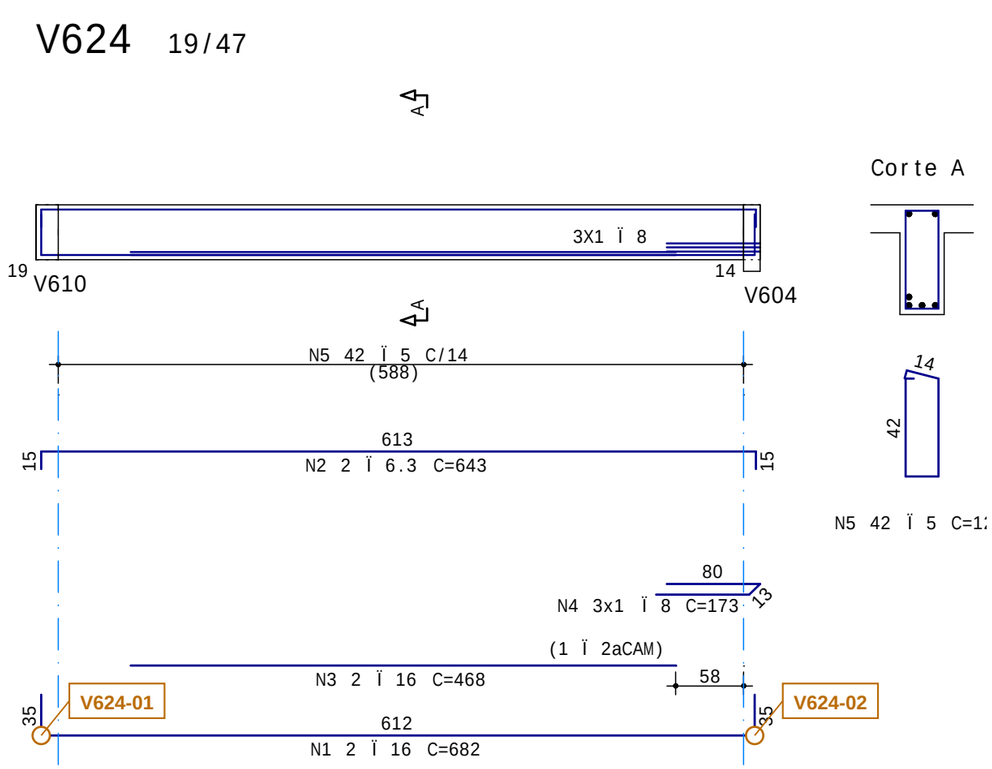


## V624-01 | Ancoragem positiva no apoio

V610: As requerida/presente = 2.13/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.3/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

## V624-02 | Ancoragem positiva no apoio

V604: As requerida/presente = 2.13/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.3/11.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V625 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

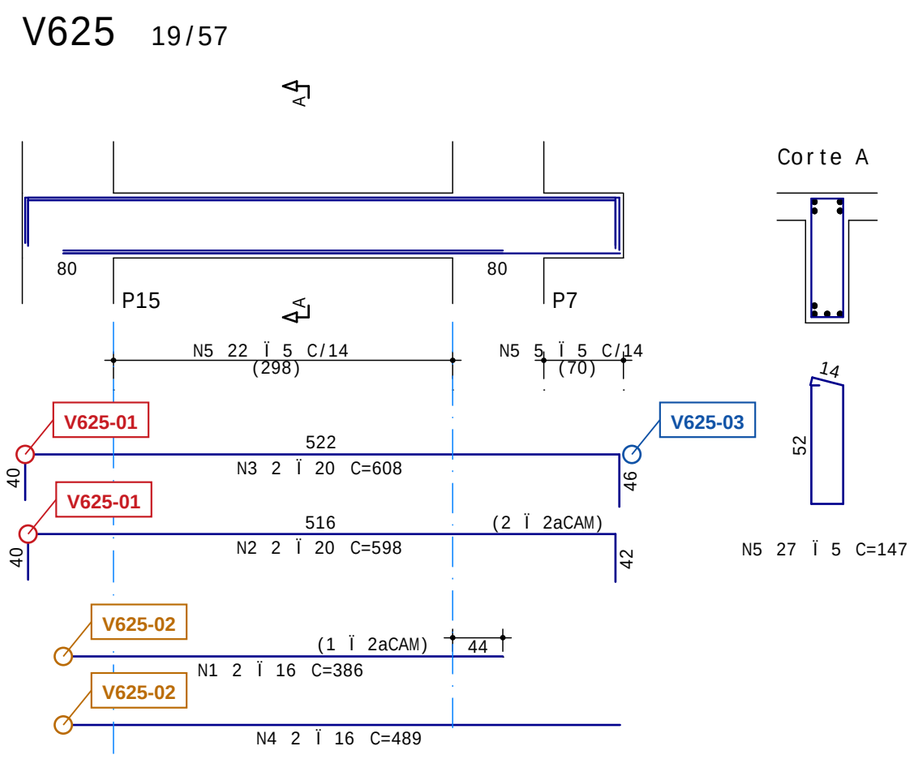


### V625-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P15. N3: perna 40.0 < 54.0 cm; N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V625-03 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

### V625-02 | Ancoragem positiva no apoio

P15: As requerida/presente = 7.87/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 43.1/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V626 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

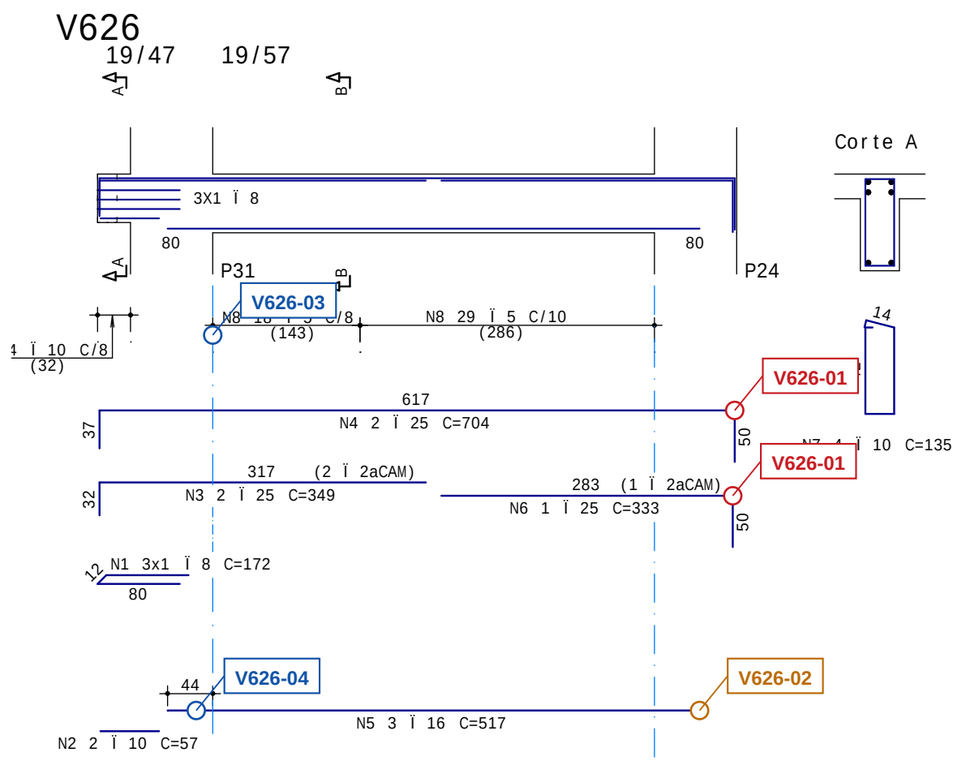


## V626-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P24. N4: perna 50.0 < 54.0 cm; N6: perna 49.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V626-03 | Suspensão / apoio indireto

Nó V610 -> V626. Transferência em região especial; confirmar caminho de carga, origem dos esforços e distribuição. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

## V626-02 | Ancoragem positiva no apoio

P24: As requerida/presente = 9.91/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 72.4/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V626-04 | Geometria e nó especial

Prolongamento esquerdo físico de 32 cm, h=47 cm, recebe V610 (~140 kN). Conferir nó, suspensão, torção e ancoragens; não tratar esta face como apoio extremo de pilar.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V627 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

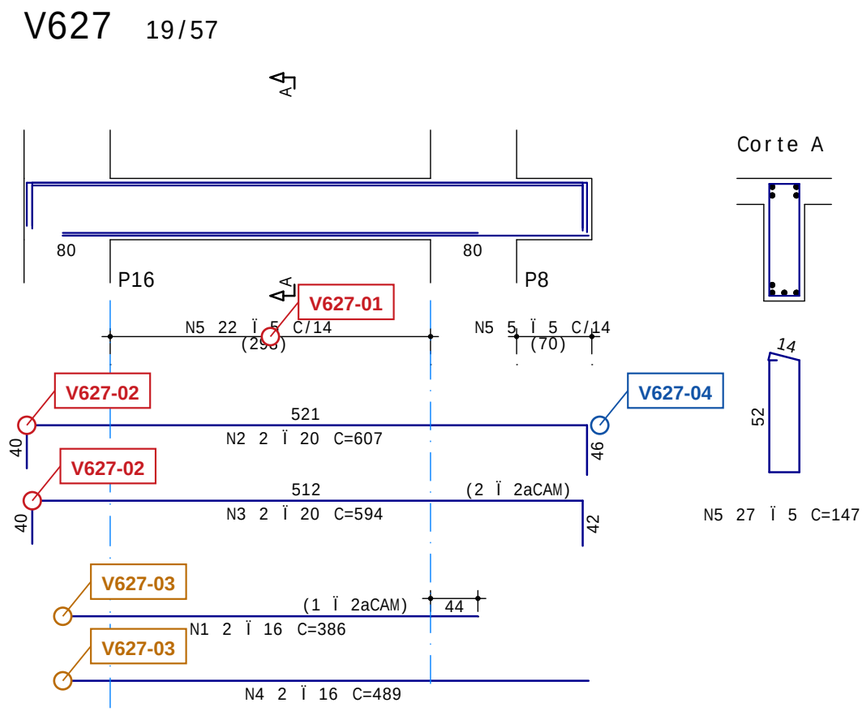


## V627-01 | Cortante / estribos

Vão 1, x=0.00 a 2.98 m: Ø5 c/14. Asw/s fornecida 2.805; exigida 2.904 cm²/m. Vk=114.25 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

## V627-03 | Ancoragem positiva no apoio

P16: As requerida/presente = 7.91/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 43.3/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

## V627-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P16. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N3: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

## V627-04 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V628 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

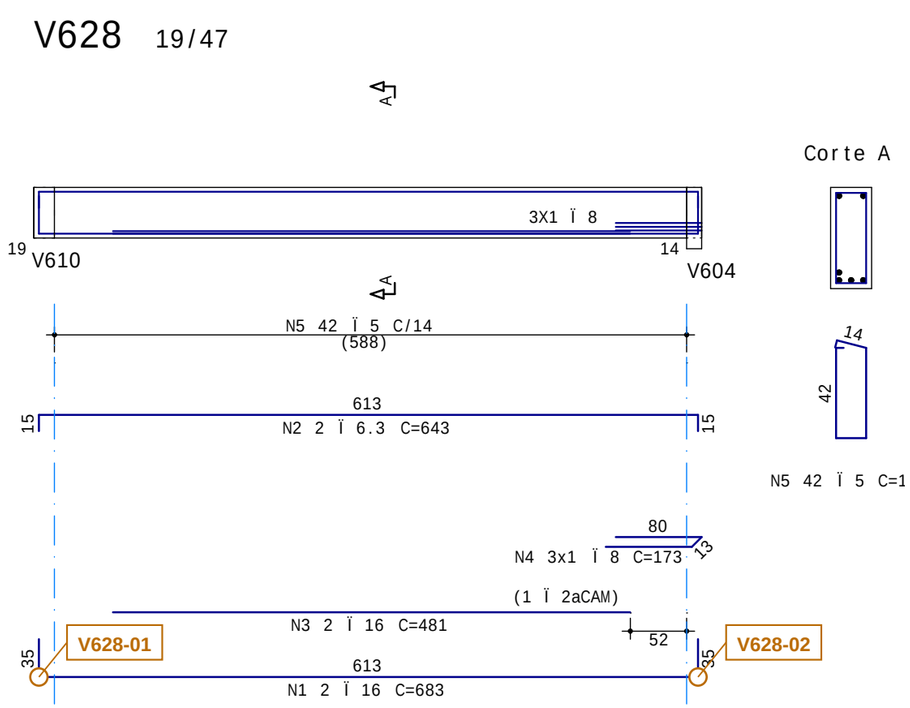


### V628-01 | Ancoragem positiva no apoio

V610: As requerida/presente = 2.16/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.7/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

### V628-02 | Ancoragem positiva no apoio

V604: As requerida/presente = 2.16/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.7/11.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.


# V629 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva

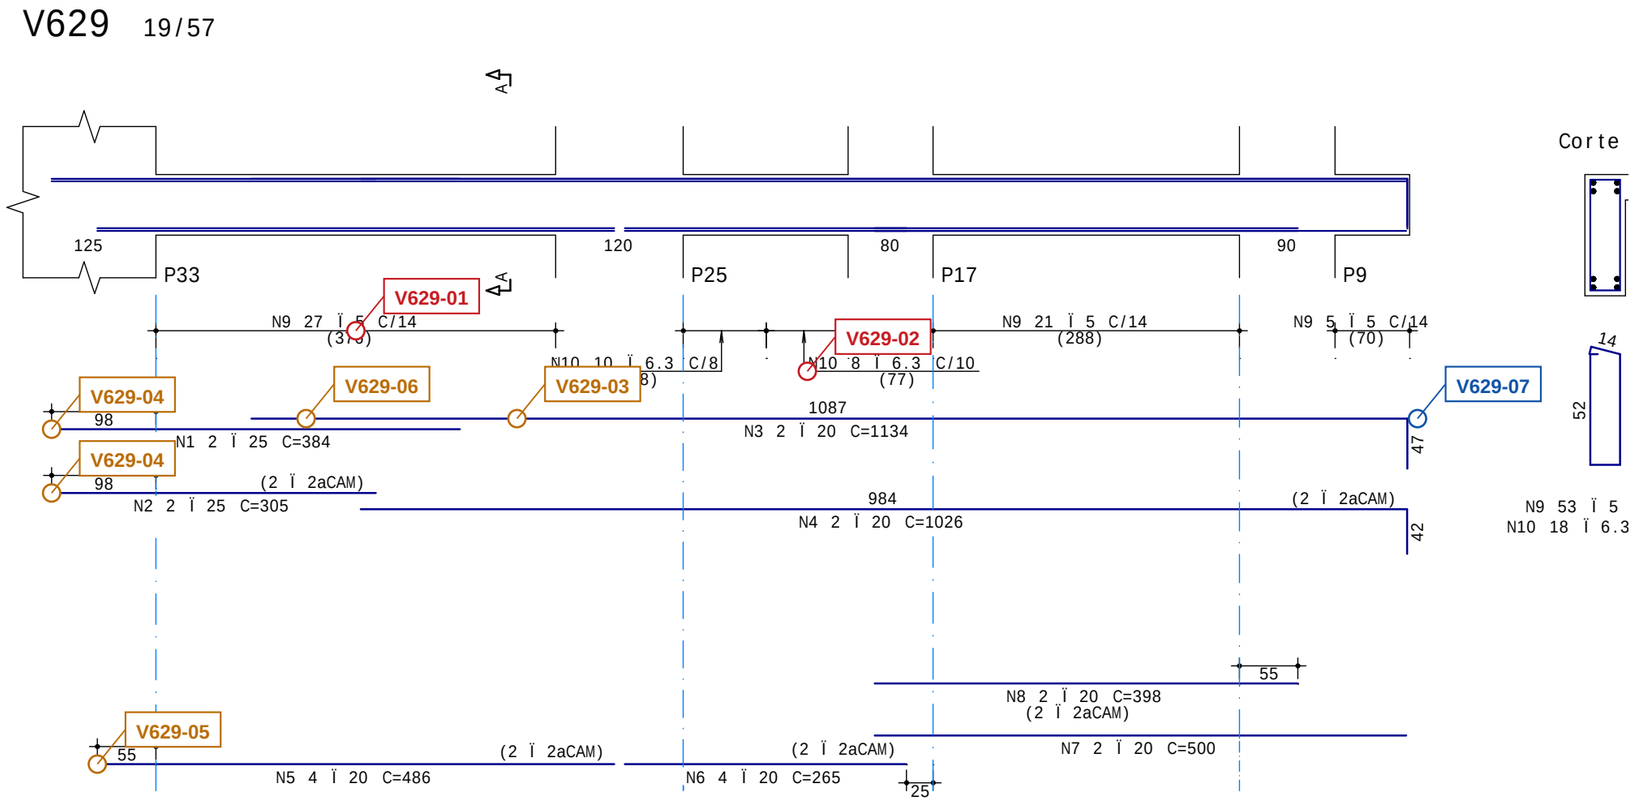


### V629-01 | Cortante / estribos

Vão 1, x=0.00 a 3.76 m: Ø5 c/14. Asw/s fornecida 2.805; exigida 2.882 cm²/m. Vk=112.26 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

### V629-02 | Cortante / estribos

Vão 2, x=5.74 a 6.51 m: Ø6.3 c/10. Asw/s fornecida 6.234; exigida 6.405 cm²/m. Vk=164.16 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

### V629-03 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, negativa (N3, N4): Msk=176.167; capacidade equivalente Mk=175.928 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

### V629-04 | Terminações da armadura negativa

Apoio P33. N1: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe); N2: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe). Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

### V629-05 | Ancoragem positiva no apoio

P33: As requerida/presente = 11.53/12.57 cm²; lb necessário/geometria = 50.5/122.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

### V629-06 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N3, N1, N2, camada 1, x=0.90 a 1.93 m. Largura necessária 16.0 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 4 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

### V629-07 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.
